北海道新幹線（新函館北斗・札幌間）工事進ちょく状況

令和5年7月1日現在

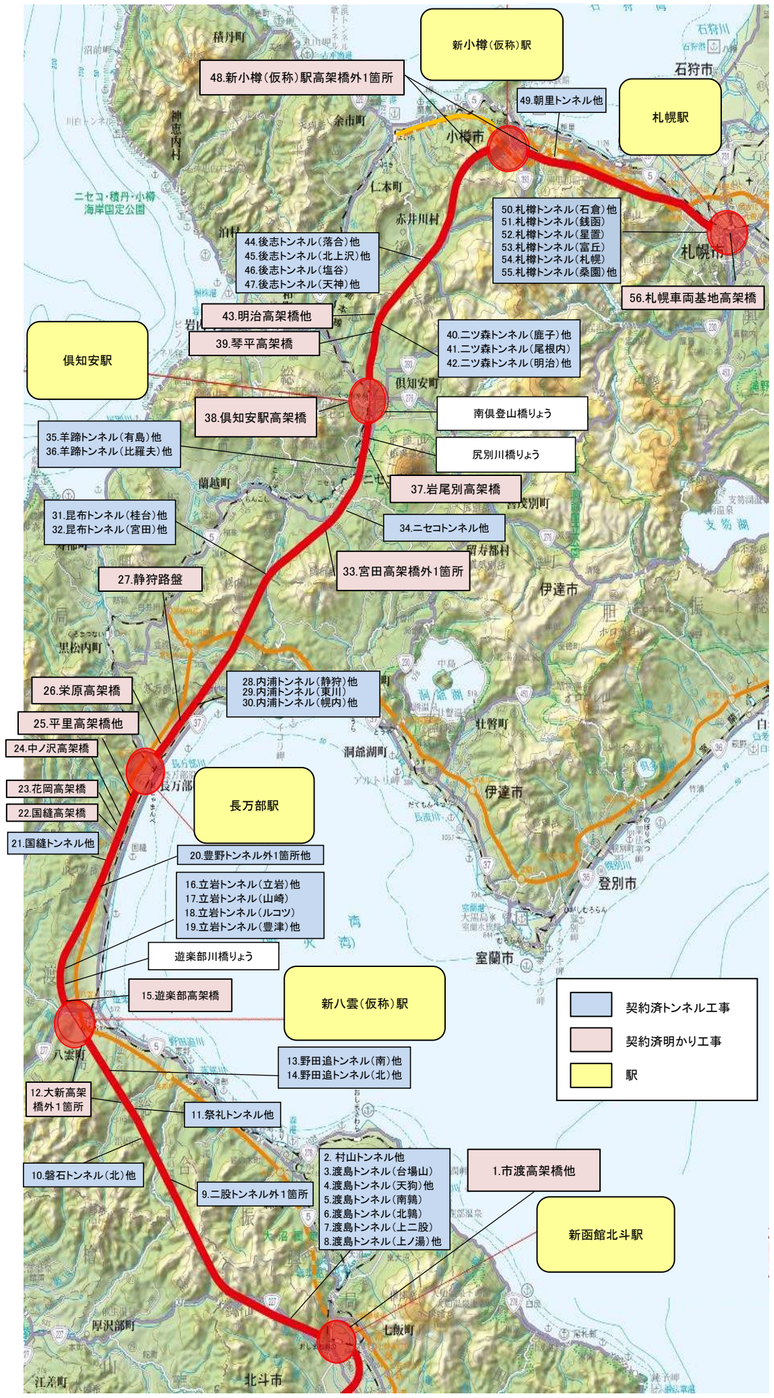

トンネル工事進ちょく状況

No	工区名	トンネル延長	掘削延長	掘削率	覆工	備考
2	村山トンネル他	5,365m	5,365m	100%	5,365m	計画変更により渡島トンネルと一本化
3	渡島トンネル（台場山）	3,500m	1,132m	32%	42m	
4	渡島トンネル（天狗）他	4,600m	2,985m	65%	1,523m	
5	渡島トンネル（南鶉）	4,400m	926m	21%	0m	
6	渡島トンネル（北鶉）	5,000m	4,396m	88%	3,292m	
7	渡島トンネル（上二股）	4,540m	2,446m	54%	0m	
8	渡島トンネル（上ノ湯）他	5,310m	3,012m	57%	2,238m	
9	二股トンネル外1箇所	3,100m	2,576m	83%	2,004m	磐石トンネル（南）を含む
10	磐石トンネル（北）他	3,150m	2,233m	71%	1,221m	
11	祭礼トンネル他	1,975m	1,975m	100%	1,836m	磐石トンネルと一本化 ※3
13	野田追トンネル（南）他	3,675m	3,591m	98%	2,181m	
14	野田追トンネル（北）他	4,550m	4,020m	88%	3,276m	
16	立岩トンネル（立岩）他	5,015m	5,015m	100%	4,977m	
17	立岩トンネル（山崎）	4,960m	3,681m	74%	2,352m	
18	立岩トンネル（ルコツ）	5,000m	5,000m	100%	4,070m	
19	立岩トンネル（豊津）他	2,065m	1,778m	86%	840m	
20	豊野トンネル外1箇所他	2,165m	1,685m	78%	1,138m	幌内トンネルを含む
21	国縫トンネル他	1,340m	1,340m	100%	503m	
28	内浦トンネル（静狩）他	5,570m	3,735m	67%	2,619m	
29	内浦トンネル（東川）	5,000m	2,045m	41%	752m	
30	内浦トンネル（幌内）他	5,000m	4,900m	98%	3,801m	
31	昆布トンネル（桂台）他	4,800m	4,800m	100%	4,769m	
32	昆布トンネル（宮田）他	5,710m	5,710m	100%	5,742m	宮田トンネルを含む
34	ニセコトンネル他	2,250m	2,250m	100%	2,250m	
35	羊蹄トンネル（有島）他	4,166m	1,201m	29%	36m	
36	羊蹄トンネル（比羅夫）他	5,569m	3,404m	61%	2,540m	
40	二ツ森トンネル（鹿子）他	4,780m	4,780m	100%	4,748m	
41	二ツ森トンネル（尾根内）	4,615m	3,362m	73%	2,145m	
42	二ツ森トンネル（明治）他	3,255m	694m	21%	0m	
44	後志トンネル（落合）他	4,865m	4,865m	100%	4,525m	
45	後志トンネル（北上沢）他	4,600m	4,600m	100%	4,543m	
46	後志トンネル（塩谷）	4,050m	1,949m	48%	288m	
47	後志トンネル（天神）他	4,460m	1,997m	45%	1,298m	
49	朝里トンネル他	4,328m	3,609m	83%	2,159m	
50	札樽トンネル（石倉）他	4,506m	995m	22%	0m	
51	札樽トンネル（銭函）	4,000m	530m	13%	0m	
52	札樽トンネル（星置）	4,400m	198m	4%	0m	
53	札樽トンネル（富丘）	4,500m	608m	14%	0m	
54	札樽トンネル（札幌）	8,446m	1,429m	17%	0m	
55	札樽トンネル（桑園）他	346m	54m	16%	0m	進ちょく率から求めた換算値
合　計		168,926m	110,869m	－	79,069m	※1

明かり工事進ちょく状況

No	工区名	延長	備考
1	市渡高架橋他	461m	高架橋、橋脚工事中
12	大新高架橋外1箇所	2,883m	準備中
15	遊楽部高架橋	1,083m	準備中
22	国縫高架橋	2,138m	準備中
23	花岡高架橋	2,639m	準備中
24	中ノ沢高架橋	1,876m	準備中
25	平里高架橋他	1,838m	高架橋基礎工事中
26	栄原高架橋	2,534m	準備中
27	静狩路盤	4,390m	準備中
33	宮田高架橋外1箇所	1,136m	高架橋基礎工事中
37	岩尾別高架橋	2,354m	高架橋基礎工事中
38	倶知安駅高架橋	3,160m	高架橋基礎工事中
39	琴平高架橋	3,395m	準備中
43	明治高架橋他	976m	橋脚基礎工事中
48	新小樽（仮称）駅高架橋外1箇所	360m	高架橋基礎工事中
55	札樽トンネル（桑園）他	659m	準備中
56	札幌車両基地高架橋	1,344m	準備中

進ちょく率

	延長	契約率	掘削率※2
路盤	211.9km	96%	66%

●工事状況

本坑掘削完了	11工区
本坑掘削中	29工区
明かり工事施工中	7工区
準備中	9工区
計	56工区

※1：単位未満四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
※2：掘削率はトンネル実延長168,926mに対する掘削済延長の比率

1.市渡高架橋他

橋脚工事状況

18.立岩トンネル（ルコツ）

防水工状況

30.内浦トンネル（幌内）他

坑内状況

41.二ツ森トンネル（尾根内）

覆工状況

47.後志トンネル（天神）他

覆工状況
